# ClickUp Structure & Business Intelligence - Be Exponential + Dinamic

# **DOCUMENTO DE REFERENCIA**

- Fecha de creación: Agosto 2025
- Propósito: Documentación completa de la estructura ClickUp para desarrollo de reportes y BI
- Alcance: Team BeExponential (ID: 9014362388) Espacios completos
- Fuente: Extracción JSON + Análisis estructural detallado

# 📳 TEAM BEEXPONENTIAL - ESTRUCTURA GENERAL

## 📊 Información del Team

- **ID**: 9014362388
- Nombre: BeExponential
- **Color**: ( #40BC86)

# 🔀 Espacios Principales

- 1. **Corporative Projects** (ID: 90141611829)
- 2. **Mid-Market Projects** (similar estructura)
- 3. Proyectos Cerrados (similar estructura)
- 4. **Dinamic** (ID: 90141588434)
- 5. **Dinamic Backlog** (ID: 90142693003)

# **© SECCIÓN 1: BE EXPONENTIAL - GESTIÓN DE PROYECTOS**

# **ESPACIOS DE PROYECTOS**

# **Corporative Projects**

- **ID**: 90141611829
- Color: ( #595d66)
- **Tipo**: Privado: false, Archivado: false

## **Estados Disponibles:**

Estado	ID	Color	Tipo	Order
to do	p90141611829_hlUs16fQ	#87909e	open	0
en progreso	p90141611829_YDDwCgO7	#5f55ee	custom	1
stuck	p90141611829_gcr6l64I	#f8ae00	custom	2
retrasado	p90141611829_hgVtZq2O	#d33d44	custom	3
asignación	p90141611829_3Vjvztr5	#ee5e99	custom	4
complete	p90141611829_qRHqUru4	#008844	closed	5

# ESTRUCTURA POR CLIENTE

Patrón General: Cada cliente = 1 carpeta con 8 listas obligatorias

## **Ejemplo: Cliente COLOMA**

• Carpeta: COLOMA (ID: 90143568519)

• Task Count: 42 tareas

• Order Index: 9

#### **LISTAS OBLIGATORIAS POR CLIENTE**

# 1. Project Information [Nombre Cliente]

• **Propósito**: Metadatos principales del proyecto

• **Ejemplo**: "Project information Coloma LTDA" (ID: 901406013045)

• **Task Count**: 1 (la tarea principal con toda la info)

# **Campos Personalizados Clave**:

Campo	ID	Тіро	Propósito
Fecha Planeada de Go live	0022fdf8-df3c-4b6d-bebe-6fe6aaa27c89	date	Fecha objetivo de salida
Fecha de inicio	055c3103-5bd7-4c5f-9dd8-d2ee55b0dce2	date	Kickoff del proyecto
Fecha Límite Linea base	79f4a4d8-7dee-443d-8d4f-4bcedafcfb4f	date	Baseline crítica
Horas totales	64587e74-4a56-4564-8596-6f77a9cec316	number	Horas contratadas totales
Hrs Estimadas	fbc3e4e3-8341-4de7-aec0-70b6c71fb81b	number	Estimación de esfuerzo
Días #	519a077f-b20d-418b-ae69-257537c1967c	number	Duración en días
Total de Días #	fc06b97a-0044-4fde-afa5-6e29ae58e0f5	number	Duración total planificada
Prioridad cliente	6cab1312-bc37-4884-8cb7-6d618c6d6366	number	Prioridad asignada
Estado proyecto	6ed5f4bb-be8e-4ea3-9ec4-a5b7521188f1	drop_down	Fase actual del proyecto
Escalar Al	84493062-6c46-44df-907b-0310fe34c930	checkbox	Indicador de escalación

#### Información Almacenada:

- Project Manager asignado
- Fase del proyecto actual
- Fecha de kickoff
- Fecha planeada de go live
- Horas contratadas totales
- Horas contratadas para desarrollos
- Horas contratadas para el proyecto

## 2. Action Items [Nombre Cliente]

- **Propósito**: Seguimiento de action items del proyecto
- **Ejemplo**: "Action Items Coloma" (16 tareas)

## **Campos Importantes:**

- Nombre del action item
- Estado
- Responsable (assignee)
- Prioridad
- Fecha de inicio
- Fecha límite

#### 3. Gaps [Nombre Cliente]

- **Propósito**: Registro de brechas/gaps identificadas
- **Ejemplo**: "Gaps Coloma LTDA" (1 tarea)

#### **Campos Importantes**:

- Nombre del gap
- Estatus
- Detalles
- Fecha de identificación
- Prioridad
- Estatus del gap
- Horas estimadas
- Archivo

#### 4. Riesgos - Issues [Nombre Cliente]

- **Propósito**: Gestión de riesgos e issues del proyecto
- **Ejemplo**: "Riesgos Issues Coloma" (2 tareas)

#### **Campos Importantes**:

- Nombre del riesgo o issue
- Action Plan
- Responsable
- Prioridad
- Fecha de reporte
- Estado

#### 5. Documentos [Nombre Cliente]

- Propósito: Gestión documental cronológica
- **Ejemplo**: "Documentos Coloma" (16 tareas)

#### **Campos Importantes**:

- Nombre del documento
- Estado

- Fase del proyecto
- Fecha de firma
- Archivo

## 6. Ordenes de Cambio [Nombre Cliente]

- **Propósito**: Control de órdenes de cambio (ODCs)
- **Ejemplo**: "Ordenes de Cambio Coloma" (1 tarea)

# **Campos Importantes**:

- Nombre de la ODC
- Prioridad
- Estatus
- Costo
- Fecha de firma
- Documento


# 7. Asignaciones [Nombre Cliente]

- Propósito: Asignaciones específicas del proyecto
- **Ejemplo**: "Asignaciones Coloma" (3 tareas)

# 8. Project Plan [Nombre Cliente] 🌟 MÁS IMPORTANTE

- **Propósito**: Plan completo del proyecto de inicio a fin
- **Ejemplo**: "Project Plan Coloma" (1 tarea principal)

#### Estructura Jerárquica:

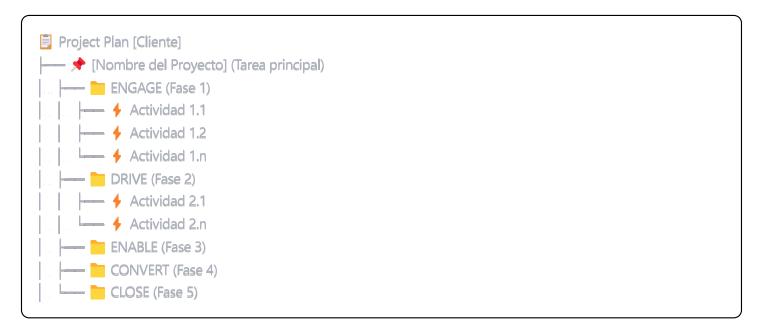

#### **Campos Importantes**:

- Nombre de la tarea (indicativas: fases, áreas; granulares: subtareas)
- Estado
- Duración estimada
- Tiempo registrado
- Persona asignada
- Fecha de inicio
- Fecha límite

Regla de Negocio: Solo el nivel más bajo de jerarquía (subtareas) representa tareas reales del proyecto.

# **Q** PATRONES DE NAMING

**Importante**: Los nombres NO son exactos, siguen patrones flexibles:

- Project Information [Cliente]
- 🔸 🔽 "Gaps [Cliente] LTDA"
- V "Riesgos Issues [Cliente]"

Para reportes: Usar búsqueda por palabras clave, NO match exacto.

# 🚀 SECCIÓN 2: DINAMIC - DESARROLLO A LA MEDIDA

